




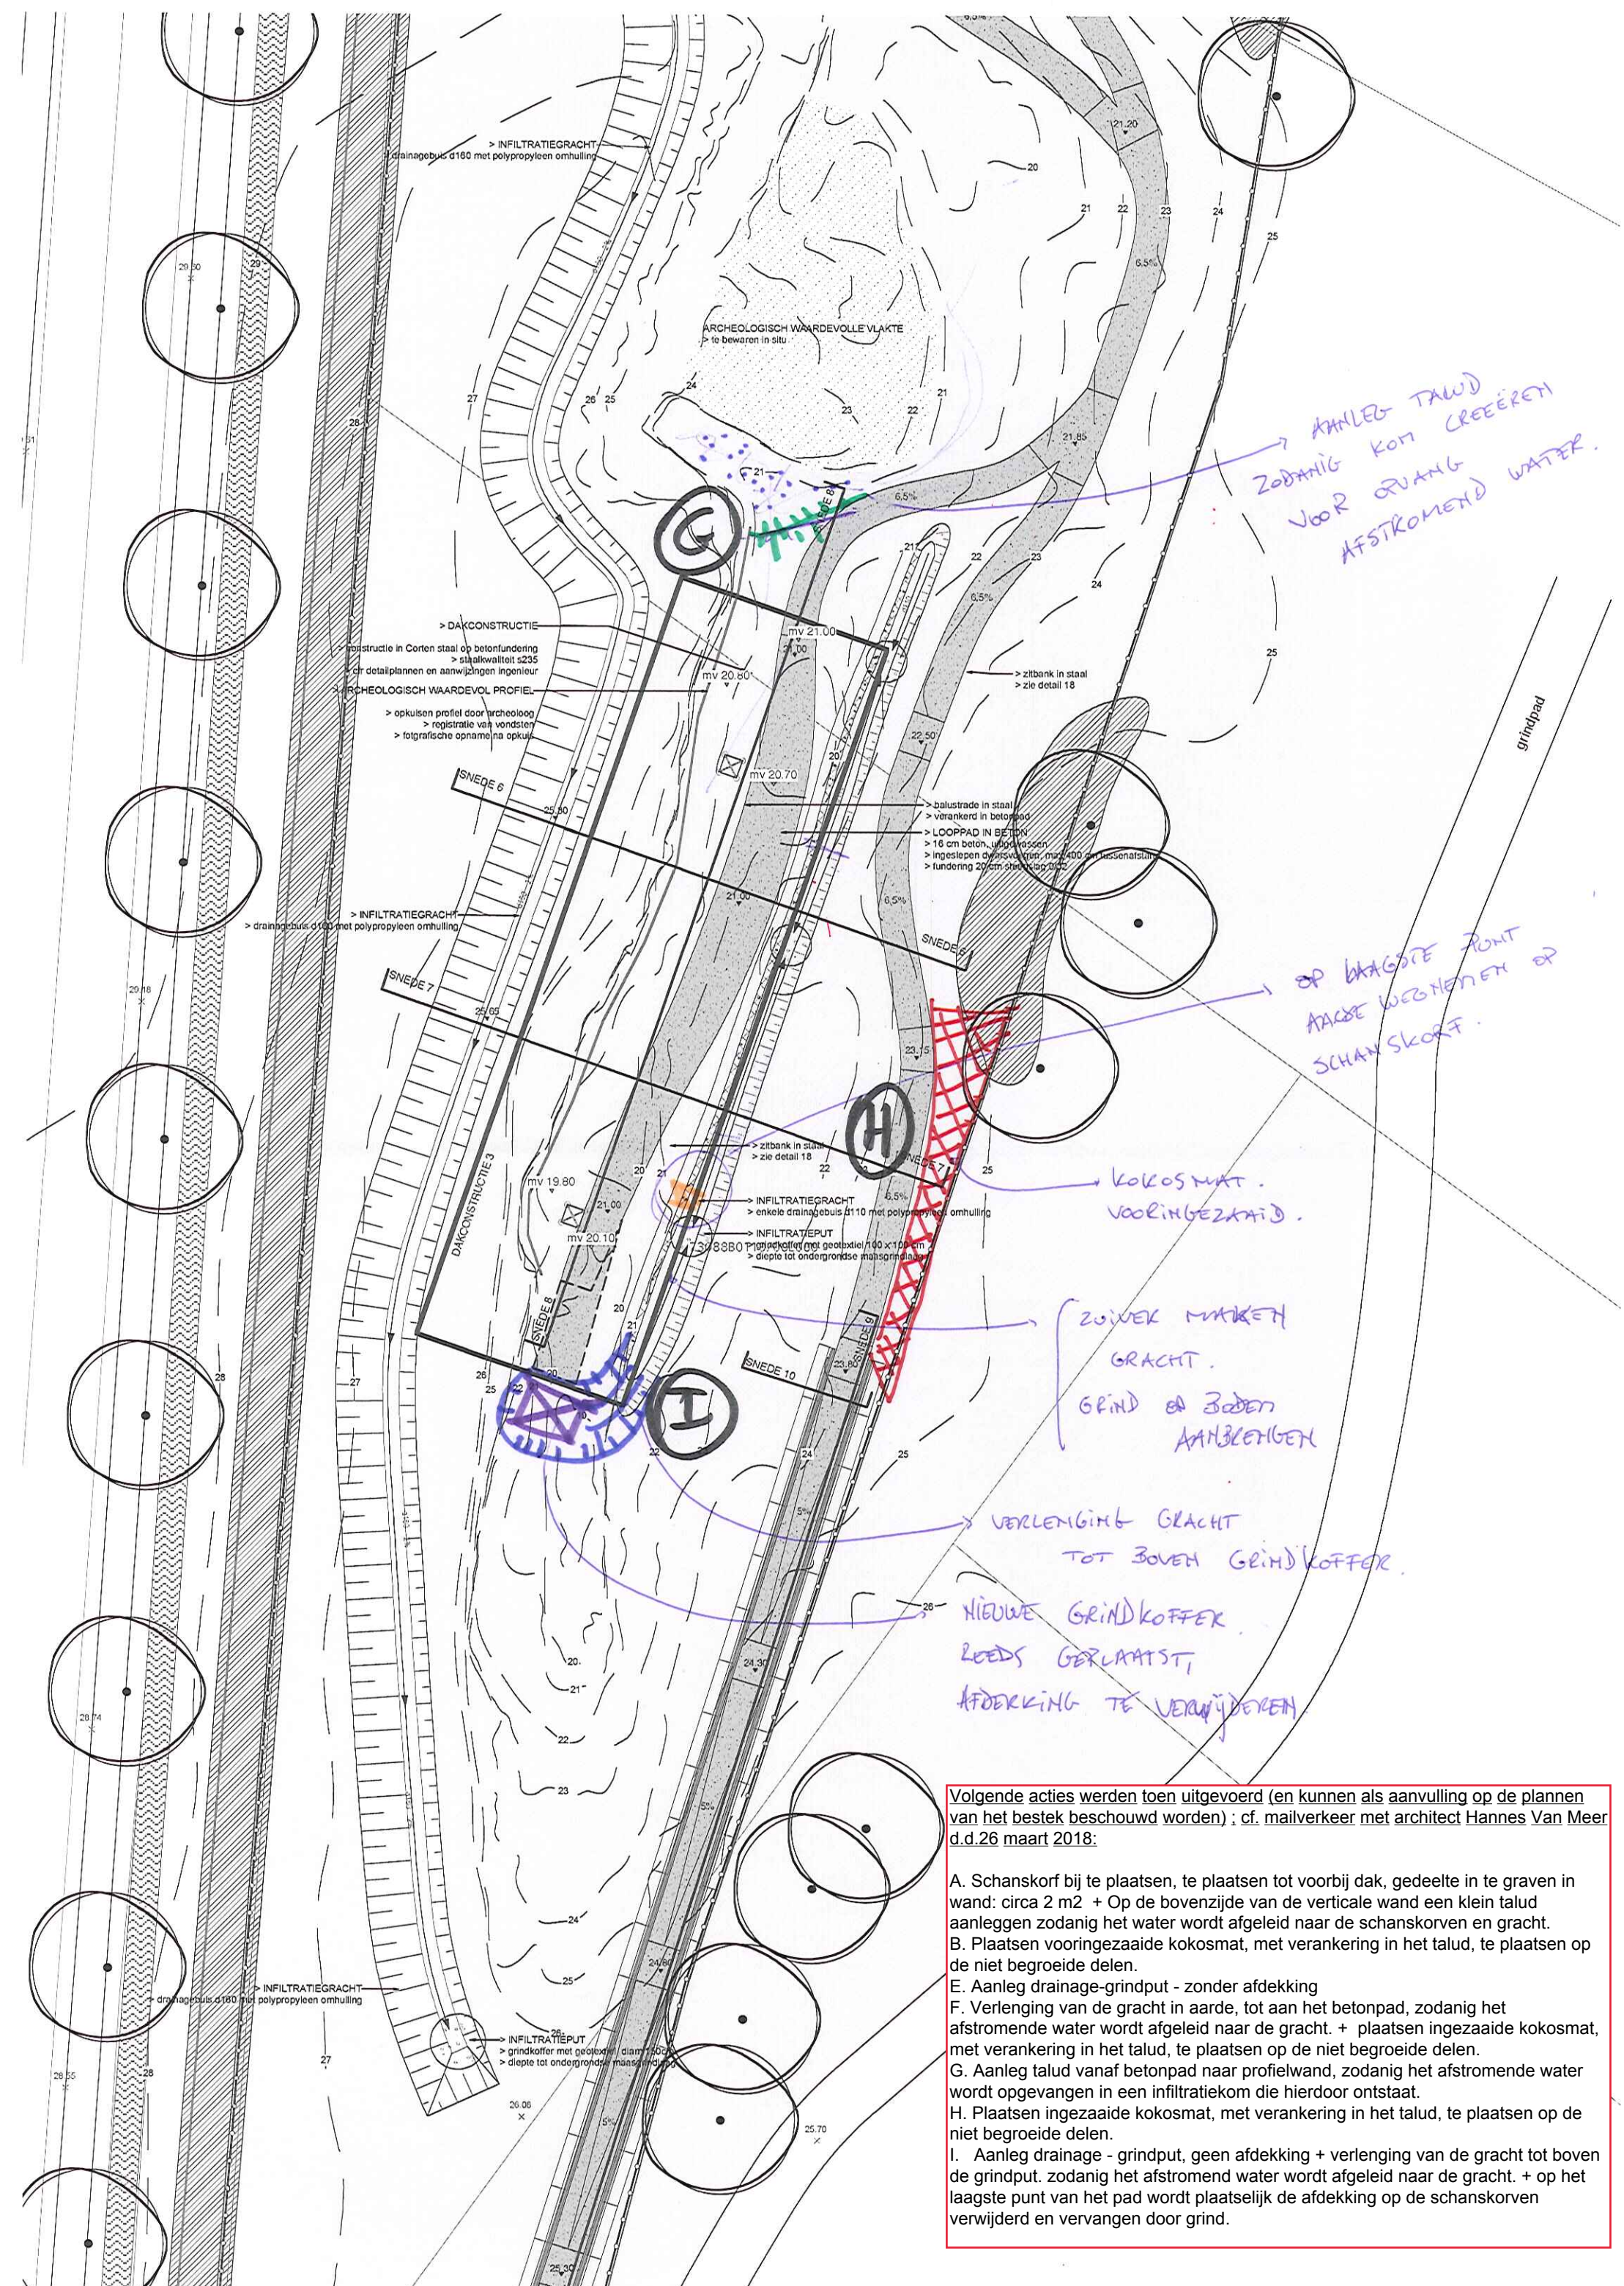

Volgende acties werden toen uitgevoerd (en kunnen als aanvulling op de plannen van het bestek beschouwd worden) ; cf. mailverkeer met architect Hannes Van Meer d.d.26 maart 2018:

- A. Schanskorf bij te plaatsen, te plaatsen tot voorbij dak, gedeelte in te graven in wand: circa 2 m2 + Op de bovenzijde van de verticale wand een klein talud aanleggen zodanig het water wordt afgeleid naar de schanskorven en gracht.
- B. Plaatsen vooringezaaide kokosmat, met verankering in het talud, te plaatsen op de niet begroeide delen.
- E. Aanleg drainage-grindput - zonder afdekking
- F. Verlenging van de gracht in aarde, tot aan het betonpad, zodanig het afstromende water wordt afgeleid naar de gracht. + plaatsen ingezaaide kokosmat, met verankering in het talud, te plaatsen op de niet begroeide delen.
- G. Aanleg talud vanaf betonpad naar profielwand, zodanig het afstromende water wordt opgevangen in een infiltratiekom die hierdoor ontstaat.
- H. Plaatsen ingezaaide kokosmat, met verankering in het talud, te plaatsen op de niet begroeide delen.
- I. Aanleg drainage - grindput, geen afdekking + verlenging van de gracht tot boven de grindput. zodanig het afstromend water wordt afgeleid naar de gracht. + op het laagste punt van het pad plaatselijk de afdekking op de schanskorven verwijderd en vervangen door grind.
